ZEITPLAN

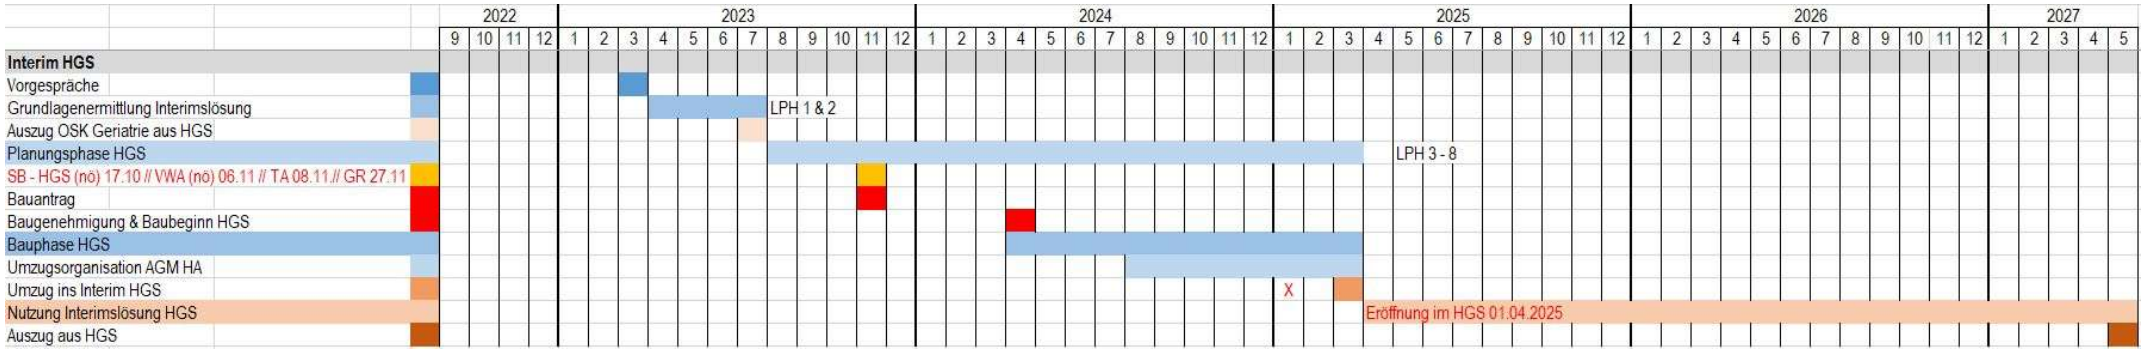
2022
2023
2024
2025
2026
2027
9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5
Interim HGS
Vorgespräche
Grundlagenermittlung Interimslösung
LPH 1 & 2
Auszug OSK Geriatrie aus HGS
Planungsphase HGS
LPH 3 - 8
SB - HGS (nö) 17.10 // VWA (nö) 06.11 // TA 08.11.// GR 27.11
Bauantrag
Baugenehmigung & Baubeginn HGS
Bauphase HGS
Umzugsorganisation AGM HA
Umzug ins Interim HGS
X
Nutzung Interimslösung HGS
Eröffnung im HGS 01.04.2025
Auszug aus HGS
